

南区区议会
规划、工程及房屋事务委员会
赤柱海滨改善工程 – 进展报告

目的

本文旨在向委员报告赤柱海滨改善工程(本工程)的最新进展情况。

背景

2. 旅游事务署，联同建筑署及土木工程拓展署，于 2002 年 9 月就本工程的设计概念咨询南区区议会，并于 2004 年 3 月咨询南区区议会辖下的规划、工程及房屋事务委员会有关施工阶段的计划及有关安排。议员和委员支持本工程并同意有关施工阶段的安排。

现时情况

3. 本工程已于 2004 年 6 月获得立法会拨款，并已于 2004 年 9 月动工。整项工程将在 2007 年 10 月分阶段完成。

4. 本工程包括五个区域。各区域的工程进展列于附件一中。工地平面图则载于附件二。

建筑署
二零零五年四月


赤柱海滨改善工程

进展报告

(2005年3月29日情况)

区域	工程项目	工程进展
1	兴建公众码头	土木工程拓展署已于2004年11月月底展开工程,预计在2006年4月完成。 随后,建筑署将开展码头上盖的建筑工程,包括从摩士公园搬移旧卜公码头上盖。工程将于2007年2月完成。
2 (第一期)	扩建海滨长廊	土木工程拓展署已于2004年11月月底展开海堤工程,预计在2006年4月完成。随后建筑署将开展海滨长廊建筑工程,工程将于2006年10月完成。
2 (第二期)	美化赤柱大街	扩阔及改善赤柱大街的工程,待海滨长廊建筑工程完成后,即会展开。改善工程需时9个月即于2007年7月完成。
3 (第一期 (ii))	改善休憩用地及海滨长廊	工程将于2005年9月展开,需时8个月完成。
3 (第二期)	改善休憩用地、海滨长廊和足球场	工程将于2006年5月展开,预计在2006年11月完成。

区域	工程项目	工程进展
4	美化水僊古庙(古庙)周围地方	清拆古庙周围地方的暂准构筑物已于2004年9月展开,并已完成。往后的外围改善工程要待民政事务局为古庙进行结构巩固工程后,才能继续进行。建筑署预计于2005年5至6月间工程可以重新展开,工程需时6个月完成。
5	改善八间屋对开的休憩用地	我们正准备就改善工程咨询八间屋当地居民。预计工程将于2005年5月展开并在2005年11月完成。

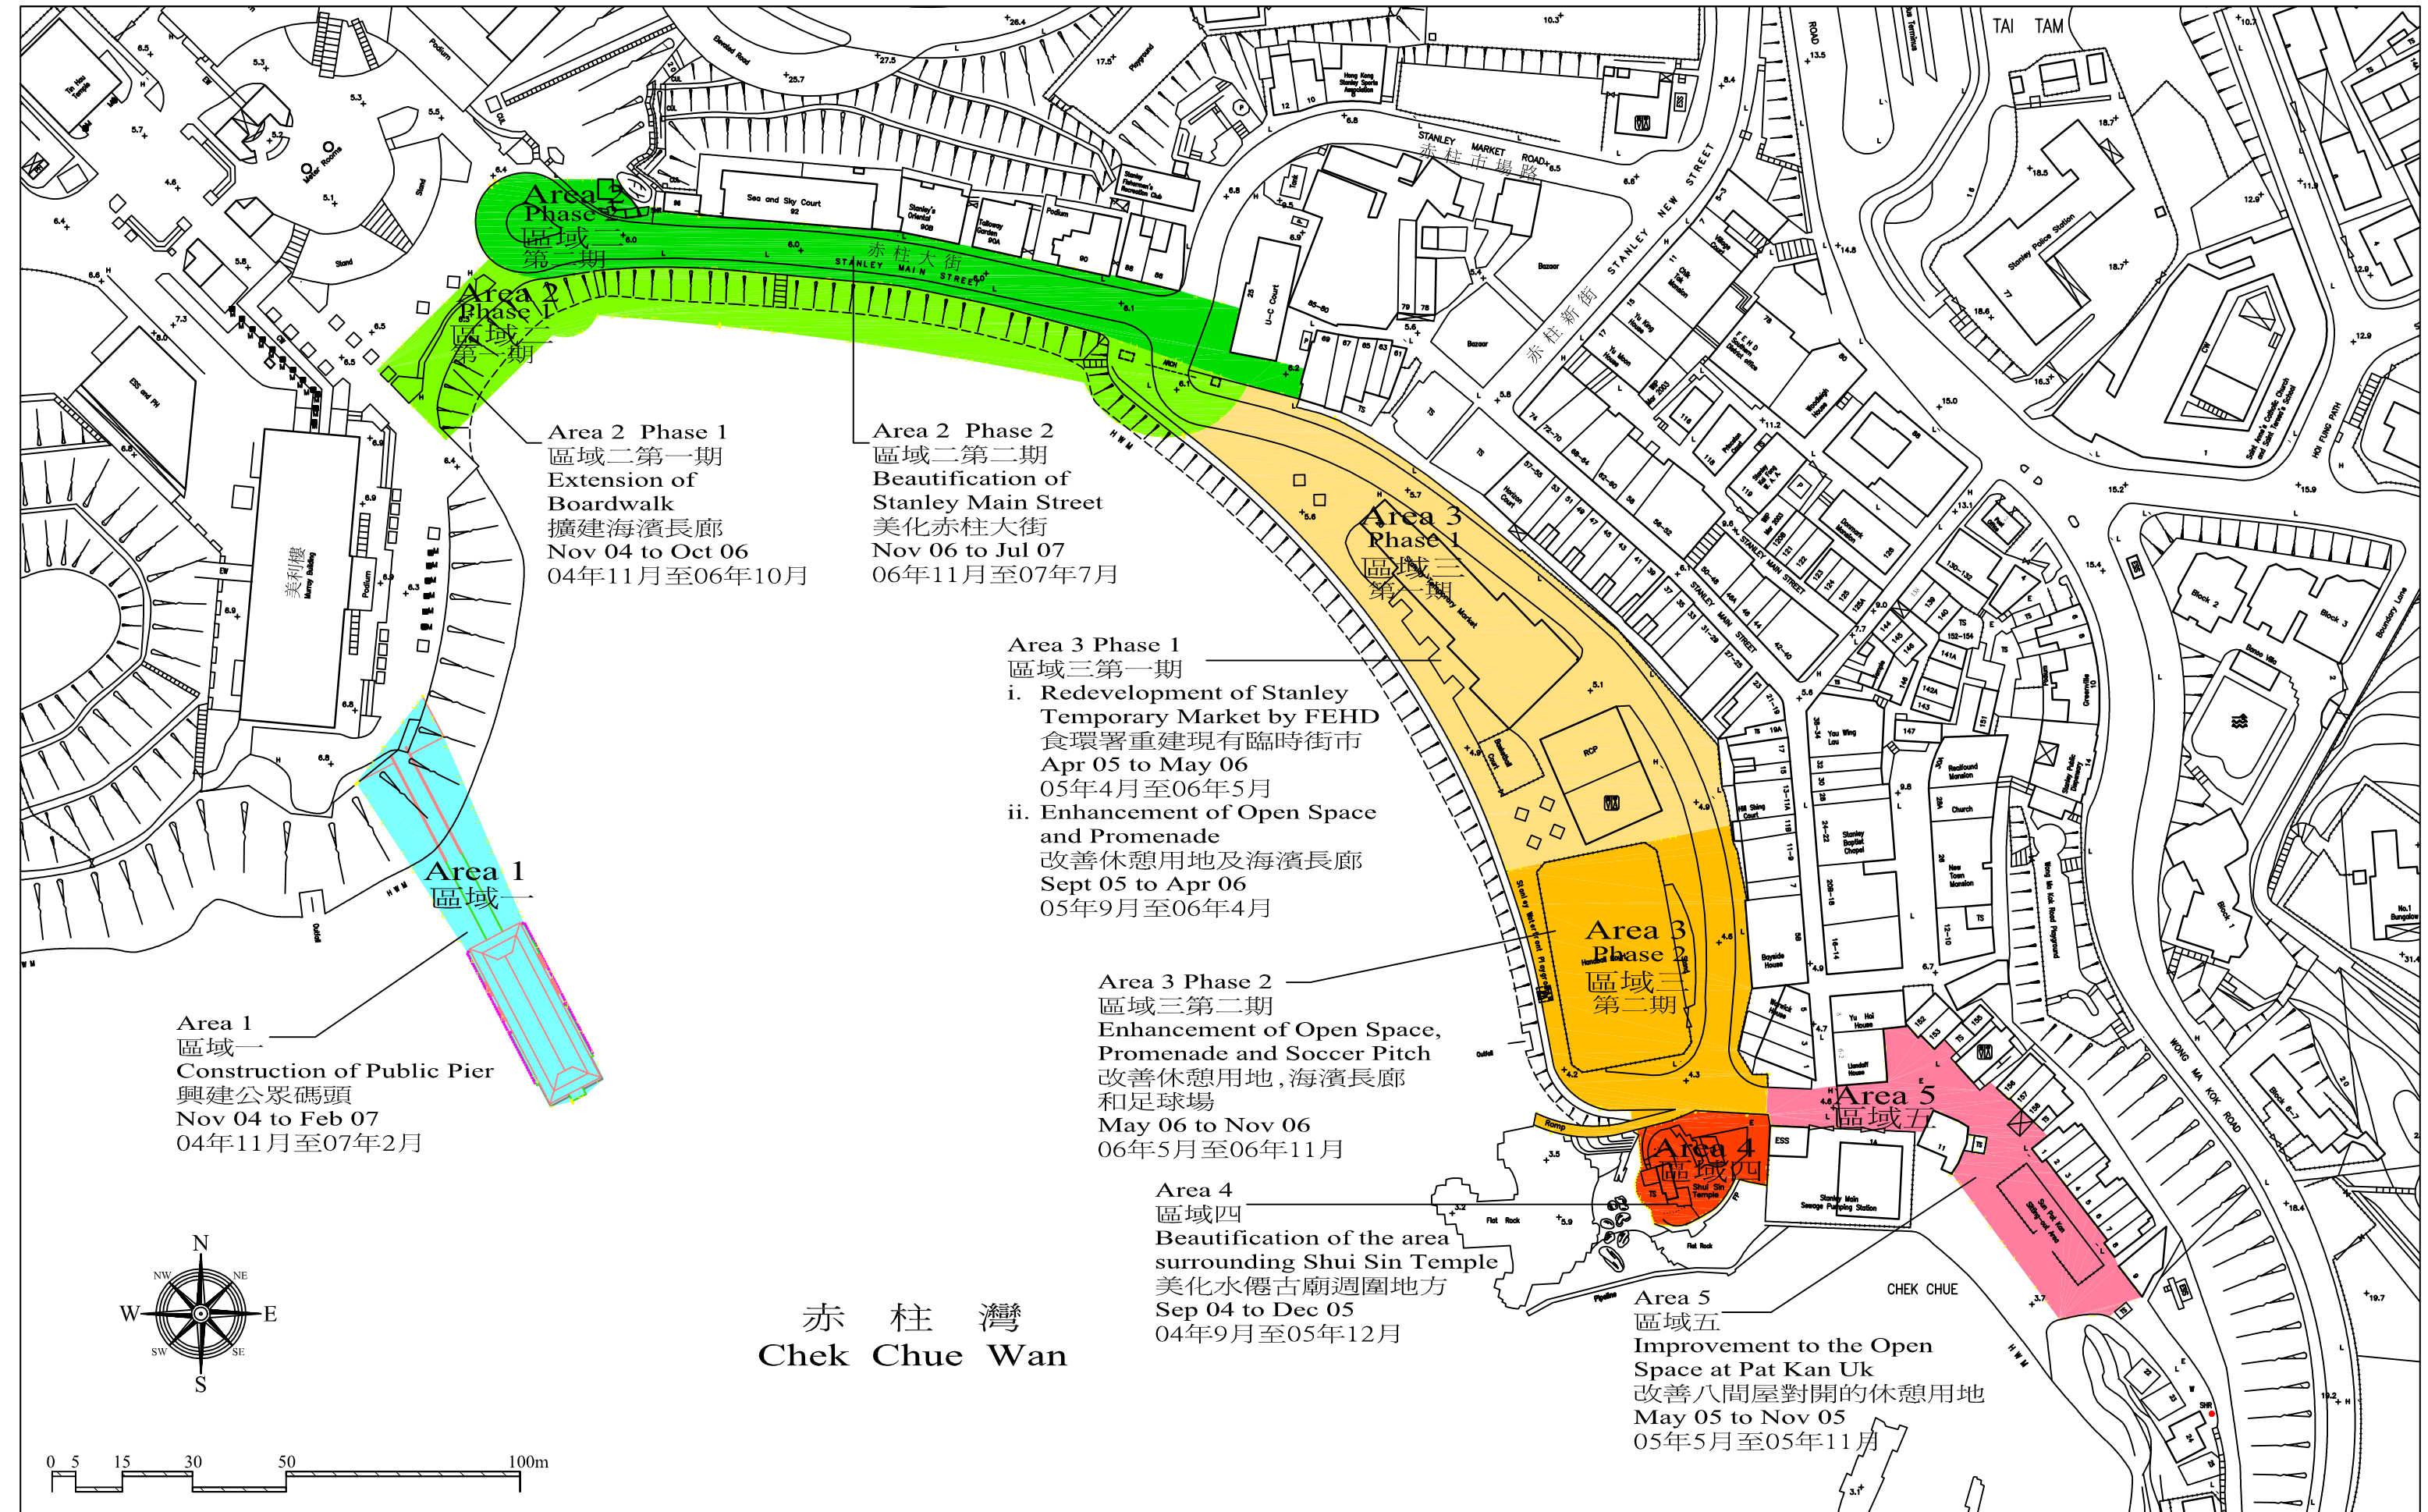

Area 2 Phase 1
 區域二第一期
 Extension of Boardwalk
 擴建海濱長廊
 Nov 04 to Oct 06
 04年11月至06年10月

Area 2 Phase 2
 區域二第二期
 Beautification of Stanley Main Street
 美化赤柱大街
 Nov 06 to Jul 07
 06年11月至07年7月

Area 3 Phase 1
 區域三第一期

- i. Redevelopment of Stanley Temporary Market by FEHD
 食環署重建現有臨時街市
 Apr 05 to May 06
 05年4月至06年5月
- ii. Enhancement of Open Space and Promenade
 改善休憩用地及海濱長廊
 Sept 05 to Apr 06
 05年9月至06年4月

Area 3 Phase 2
 區域三第二期
 Enhancement of Open Space, Promenade and Soccer Pitch
 改善休憩用地, 海濱長廊和足球場
 May 06 to Nov 06
 06年5月至06年11月

Area 4
 區域四
 Beautification of the area surrounding Shui Sin Temple
 美化水僊古廟週圍地方
 Sep 04 to Dec 05
 04年9月至05年12月

Area 5
 區域五
 Improvement to the Open Space at Pat Kan Uk
 改善八間屋對開的休憩用地
 May 05 to Nov 05
 05年5月至05年11月

Area 1
 區域一
 Construction of Public Pier
 興建公眾碼頭
 Nov 04 to Feb 07
 04年11月至07年2月

赤柱灣
 Chek Chue Wan
