

油尖旺区议会  
尖沙咀海滨长廊美化计划 -  
最新进展及施工时间表

目的

向议员汇报尖沙咀海滨长廊美化计划(计划)的最新进展及施工时间表。

背景

2. 我们曾于二零零三年二月就尖沙咀各项建议的旅游措施征询油尖旺区议会的意见。其中一项措施是美化尖沙咀海滨长廊。计划涵盖梳士巴利道以南的露天地方，由尖沙咀天星小轮码头广场、香港文化中心和香港艺术馆起，沿尖东海滨长廊一直伸展至国际邮件中心。当局会根据计划兴建园景建筑 and 栽种花木，重置街道照明，把部分空地辟作休憩花园、户外活动及表演场地和露天茶座，以及在香港文化中心对开的露天广场提供灯光和音响设备，务求令上述海滨一带地区的面貌焕然一新。议员对建议表示欢迎及支持。

最新进展

3. 二零零四年二月，立法会财务委员会批准拨款进行计划。建筑署随即拟订分段施工安排及进行招标。工程已于二零零四年八月三十一日展开。

工程项目时间表及分段施工

4. 计划会分阶段进行，预定于二零零六年四月完成。为尽量减少滋扰，建筑署与有关部门磋商后，拟订分段施工计划，详情见附件甲。缓解措施以把工程期间可能带来的滋扰减至最低的详情则见附件乙。

5. 我们已成立工地联络小组，成员包括旅游事务署、建筑署、康乐及文化事务署、香港警务处、海事处、油尖旺民政事务处及承建商。小组定期开会，以密切监察实际工程进度。若分段施工计划有重要改变，我们会通知议员。

6. 議員請細閱計劃的分段施工詳情及緩解措施。

經濟發展及勞工局  
旅遊事務署  
二零零四年九月

**尖沙咀海滨长廊美化计划  
分段施工计划**

| 地点<br>(请参阅<br>附录的地图) | 关涉地区   | 时间   |
|----------------------|--|--|
| A                    | 天星小轮码头入口处  | 二零零五年年中至<br>二零零六年四月  |
| B1                   | 香港文化中心露天广场<br>(北面)   | 二零零四年九月至<br>二零零五年四月  |
| B2                   | 香港文化中心露天广场<br>(南面)及柱廊  | 二零零五年四月至<br>十二月<br>(此地区工程会在 B1 地区工<br>程完成后才展开)                 |
| C1                   | 香港艺术馆对出空地<br>(南面)  | 二零零四年十月至<br>二零零五年三月  |
| C2                   | 香港文化中心及太空馆对出空地<br>(此地区工程会再进一步分阶段进<br>行,承建商会在完成工地某些部份<br>的工程,才会展开其它部份的工<br>程) | 二零零四年九月至<br>二零零六年四月<br><br>(在这二十个月内,承建商<br>只会在同一时段内占用部份<br>工地) |
| C3                   | 香港艺术馆对出空地<br>(北面)  | 二零零五年三月至<br>十二月<br>(此地区工程会在 C1 地区工<br>程完成后才展开)                 |
| D                    | 露天餐厅   | 二零零四年九月至<br>二零零六年四月  |
| E                    | 星光大道(更换街灯)   | 二零零五年五月至十二月  |
| F                    | 尖沙咀海滨长廊东部<br>(更换街灯)  | 二零零五年五月至<br>十二月  |


## 尖沙咀海滨长廊美化计划

### 缓解措施

实行下列各项缓解措施以把工程期间可能带来的滋扰减至最低 -

- (1) 在整段施工期内，会提供足够和安全的行人道，内有充足的照明，并设有指示标志，说明前往附近景点及设施的方向；
- (2) 施工期内无论何时均会保留指定的紧急车辆通道；
- (3) 为把对香港文化中心、香港艺术馆、香港太空馆和星光大道等场地的日常运作的影响减至最低。在这些场地对开空地进行的工程会分阶段施行。当局会为这些场地的使用者及市民提供安全和方便的通道；
- (4) 采取充分的噪音缓解措施，控制施工时产生的噪音水平。这些措施包括使用灭音器，用围板作为地面的隔音屏障，禁止在某些场地进行超过许可噪音水平的工程；
- (5) 在施工期内，会竖设附有临时照明的围板或其它种类的临时屏障以确保公众安全。由于尖沙咀是主要旅游区，因此当局会粉饰围板，令人看起来更有美感和悦目；
- (6) 所有工程均会按照环境保护署及其它有关部门的指引进行。除上述措施外，当局还会管制尘埃、废水的处理和排放及地盘污水所造成的滋扰，以确保不超越既定的标准和准则；以及
- (7) 在主要假日庆祝活动如圣诞节、除夕及农历新年举行期间，当局会因应工地情况及工程施工进度，考虑工地一带是否适合举行活动。若有活动举行，我们会与警务处及有关部门共同制订适当的安全及人羣管理措施。


经济发展及劳工局  
旅游事务署  
二零零四年九月

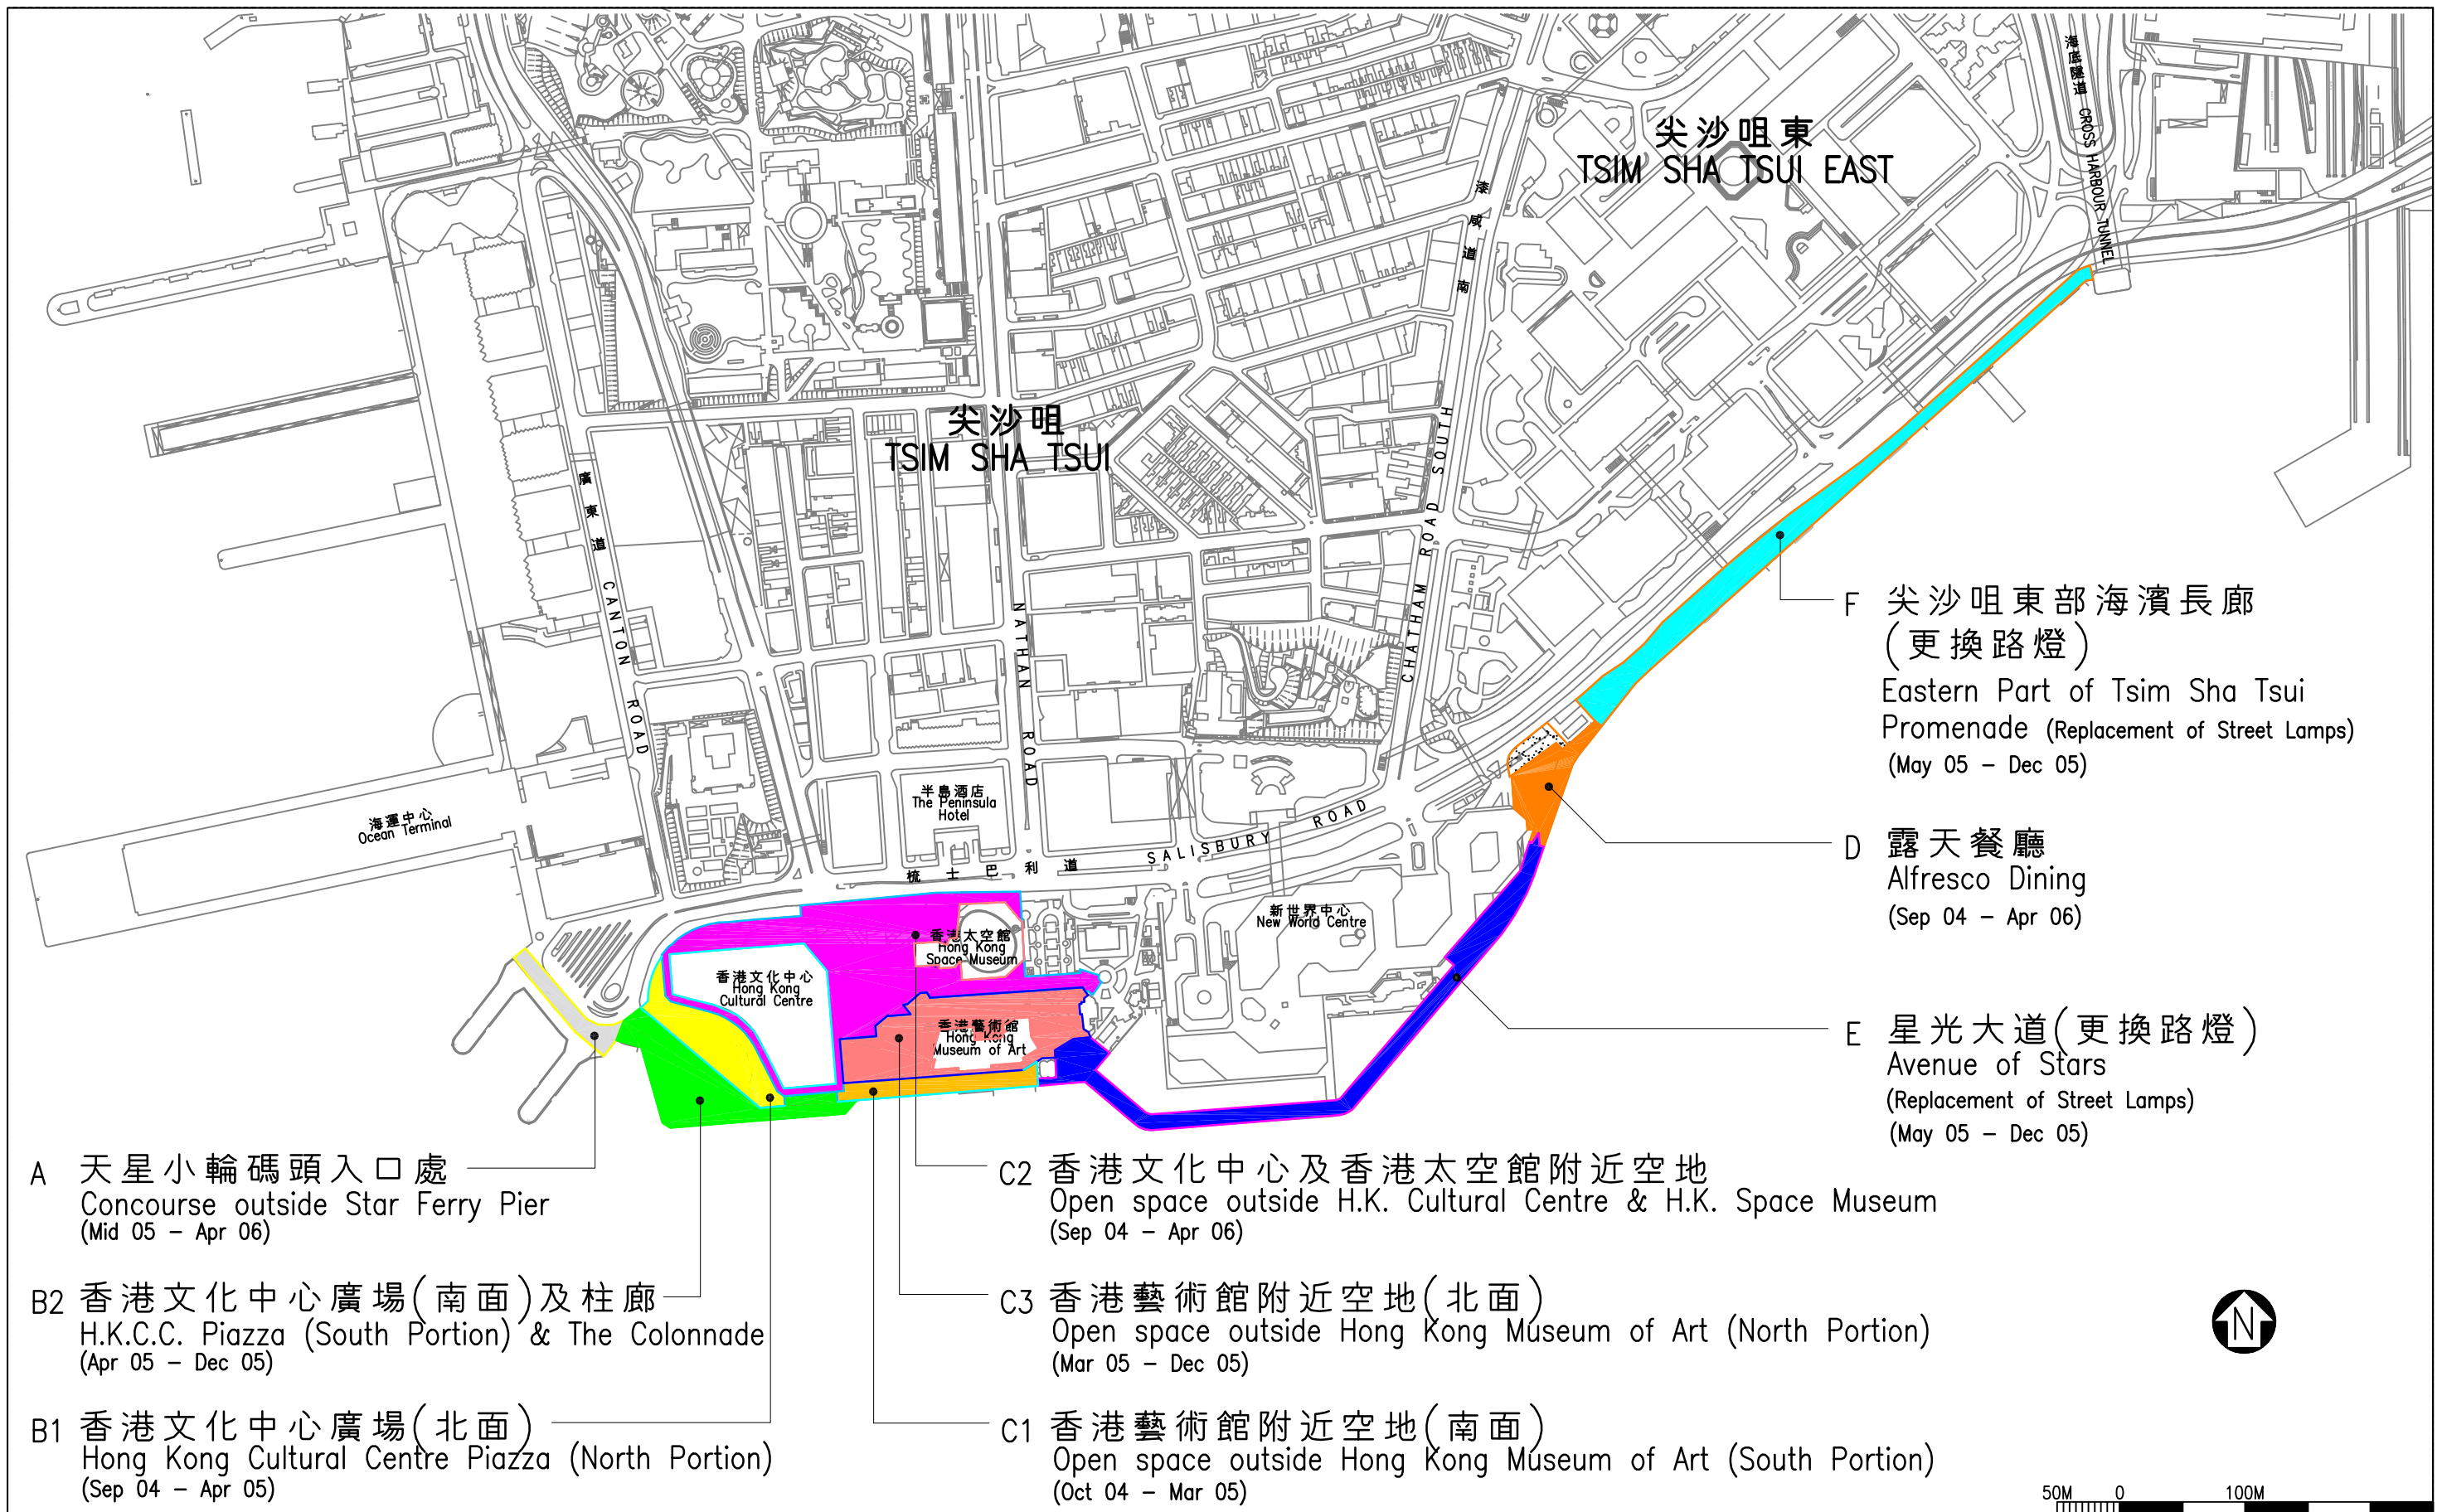

385R0

尖沙咀海濱長廊美化計劃

Tsim Sha Tsui Promenade  
Beautification  
Works Phasing Plan



Architectural  
Services  
Department

施工階段設計圖
